

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

PROGRAMA: FONDO III - 2023

CONTRATO: MVC/239951005-F-III-2023

CONSTRUCTOR: KAREN GURROLA ROMERO

En la Localidad de Estación la Colorada, Villa de Cos, Zac., en el lugar que ocupa la calle Agraristas, siendo las 12:00 horas del día 12 del mes de abril de 2023. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los C.C. Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ, ING. ADRIÁN GONZÁLEZ NAVA, ING. JULIO CESAR RIVERA PÉREZ, ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ÁLVAREZ, KAREN GURROLA ROMERO Y LA C. MA. ELVIRA DOMÍNGUEZ BALDERAS; PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CONTRALOR MUNICIPAL, CONTRATISTA Y REPRESENTANTE DEL COMITÉ respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega – Recepción de la Obra denominada:

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE AGRARISTAS DE LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN LA COLORADA, VILLA DE COS, ZAC.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.


Ubicación – Estación la Colorada

Municipio: Villa de Cos

Programa: FONDO III-2023

Modalidad de Contratación: Contrato

Nombre del Constructor: KAREN GURROLA ROMERO

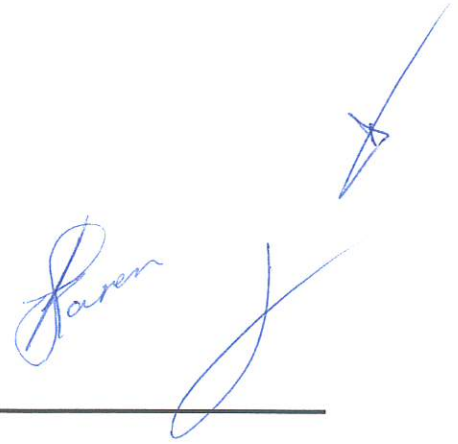

PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO	24	MARZO	2023
FECHA DE TERMINACION	11	ABRIL	2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

TRAZO Y NIVELACION DE RED DE AGUA POTABLE CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B EN SECO INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN EXCAVACIÓN DE 0.00 - 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.

EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO C EN SECO INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN EXCAVACIÓN DE 0.00 - 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.

PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBOS DE PVC CON JUNTA HERMÉTICA PARA AGUA POTABLE DE 2" RD - 26, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ARROPE DE TUBERÍA CON MATERIAL FINO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELLENO A VOLTEO CON MEDIOS MANUALES, CON PALA EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, INCLUYE: EXCAVACION, TUBERIA O MANGUERA SEGÚN CORRESPONDA, RELLENO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE

TRAZO Y NIVELACION PARA ZANJA INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.


EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE FONDO, TALUDES, TRASPALEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE FONDO, TALUDES, TRASPALEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

ARROPE DE TUBERIA CON MATERIAL FINO (ARENA CONTAMINADA O SIMILAR) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELLENO COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBOS DE PVC CON JUNTA HERMÉTICA PARA ALCANTARILLADO DE 10" SERIE 25, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 0.61X1.00 MTS DE ANCHO, MURO A BASE DE TABICÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 Y APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ESCALÓN DE VARILLA LISA Y PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES

CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 6" CEDULA 20, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA TUBERIAS, ARROPE, RELLENO DE ZANJA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

LA INVERSIÓN DE LA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS SIGUIENTES:

APROBADA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO
MVC/239951005-F-III-2023	24/03/2023	\$ 254,866.38

EJERCIDA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO
MVC/239951005-F-III-2023	11/04/2023	\$ 254,866.38

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: \$ 254,866.38

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN No.	No. DE FACTURA	PERIODO DEL	AL	IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
1		24/03/2023	30/03/2023	\$ 51,448.00	\$ 51,448.00
2 y/o FINIQUITO		30/03/2023	11/04/2023	\$ 203,418.38	\$ 254,866.38
IMPORTE TOTAL CON IVA					\$ 254,866.38

Handwritten signature: Karen

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO			

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
CUMPLIMIENTO	2209171 24/03/2023	\$ 24,486.64	CHUBB FIANZAS MONTERREY

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyo fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
VICIOS OCULTOS	2210739 10/04/2023	\$ 24,486.64	CHUBB FIANZAS MONTERREY

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente **acta de Entrega – Recepción** para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.



DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS: NO APLICA

MANUALES: NO APLICA

INSTRUCTIVOS: NO APLICA

CERTIFICADOS: NO APLICA

GARANTIAS: VICIOS OCULTOS 1 AÑO

ARCHIVOS: NO APLICA

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

ENTREGA: (CONTRATISTA)

CONSTRUCTOR: KAREN GURROLA ROMERO

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____



RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. ADRIÁN GONZÁLEZ NAVA

CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

FIRMA: 



SUPERVISO: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. IZZET ORTEGA DE LA CRUZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

FIRMA: 



Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ÁLVAREZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. MA. ELVIRA DOMÍNGUEZ BALDERAS

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: 
